

Dans le planning Hebdo, vous avez la possibilité de planifier la mise en œuvre sur le terrain de vos salariés, vos engins.

Avec les ressources, vous avez la possibilité de faire un **planning prévisionnel** sur plusieurs semaines et gérer les quantités de ressources disponibles/planifiables.

Vous pouvez ainsi affecter une quantité de ressources possibles et d'affecter un nombre de ressources sur les chantiers / projets en prévision des besoins futurs.

Il est aussi possible sur les ressources de main d'œuvre d'ajouter un coût supplémentaire lié à la zone de déplacement pour être utilisé dans les devis.

Les ressources dans Optim'BTP

La notion de ressources accessibles sur le planning hebdo correspond à la main d'œuvre, à la sous-traitance et suivant les métiers aux engins/transport.

Pour apparaître dans les ressources du planning :

- Les types salariés doivent être marqués en « **Budget** » dans les paramètres Métier (**Options > Paramètres > Métier > Type de salarié**).

The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'Métier' section selected. The 'Type de salarié' configuration is displayed for the 'Chant' resource type. The 'Budget' checkbox is checked, indicating that this resource type is eligible for budgeting in the planning tool.

Code	Type de salarié	Regroupement	Ordre	Couleur	Int.	Budget	Dés.
Chant	MO Chantier	MAIN D'OEUVRE	1	[Blue]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atel	MO Atelier	MAIN D'OEUVRE	2	[Yellow]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etud	MO Etude	MAIN D'OEUVRE	3	[Green]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chauf	MO Chauffeur	MAIN D'OEUVRE	4	[Orange]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chef	MO Chef de chantier	MAIN D'OEUVRE	5	[Red]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interim	Interim	MAIN D'OEUVRE	6	[Dark Blue]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
apprenti	apprenti	MAIN D'OEUVRE	7	[Light Blue]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuration details for 'Chant':

- Code: Chant
- Libellé: MO Chantier
- Regroupement: MAIN D'OEUVRE
- N° ordre: 1
- Couleur: [Blue]
- Intérim:
- Budget:

Types externes liés:

Logiciel externe	Type	Sous Type Code	Sous Type Libellé
OptimBTP	OUV		OUV
OptimBTP	CH		CH
OptimBTP	MO		MO

- Les types d'articles *Matériel* (exemple : Engin/transport) ou *Sous-traitant* doivent avoir l'option « **Ressource Planning** » de cochée.

Paramètres

Liste

Métier

Regroupement type

Type de salarié

Champ optionnel

Repas

Déplacement

Absence

Certificat/Habilitation

Motif d'heure

Famille d'article

Type d'article

Catégorie de tiers

Phase

Poste de travaux

Marquage achat

Complément sous-traitance

Marquage sous-traitance

Mode de paiement

Mode de règlement

Profil

Système

Type d'article

Code	Type d'article	Regroupement	Ordre	Mat	Engin	Ss trait	Fact. Int.	Frs Cht	Amort.	Vente	Déchet	Budget	Rsrce Png	Dés.
MT	Matéri...	MATERIAUX	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONS	Conso...	MATERIAUX	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BET	Béton	MATERIAUX	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FER	Ferraille	MATERIAUX	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TUAR	Tuile/A...	MATERIAUX	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZINC	Zinc	MATERIAUX	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interim	Interim	SOUS-TRAITANCE	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Locat	Location	MATERIEL et LOI	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAT	Matériel	MATERIEL et LOI	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Désactiver

Code: MAT

Libellé: Matériel

Regroupement: MATERIEL et LOCATION

Type de gestion: Demande de prix/Commande

Ordre: 9

Matériaux / Fourniture
 Engin / Matériel
 Sous-Traitance
 Fact. Intérim
 Divers / Frais chantier
 Amortissement
 Vente
 Déchet

Types externes liés :

Logiciel externe	Type	Sous Type Code	Sous Type Libellé
OptimBTP	ML		ML

Id:53

- Les articles associés doivent être obligatoirement en **unité d'heure**.

Gestion des articles (base articles)

Import Export Modulation tarif Dde prix Commande Stock Impression Rechercher

Bibliothèque Type article Location/Matériel/Engin Fournisseur

Type gestion Famille

Fabricant Famille tarif Appli mobile

Code	Libellé	Unité	Type d'article	Type de gestion	Fabricant	Famille fabricant
BANCHE	BANCHE	Heure	Engin	Non géré		
BC	Baraques de chantier	Jour	Engin	Demande de ...		
BETONNIERE	BETONNIERE	Heure	Engin	Non géré		
BLIND	Blindage de tranchée	Jour	Engin	Demande de ...		
BULL	BULL	Heure	Engin	Non géré		
CAM10T	Camion 10T	Heure	Engin	Non géré		
CAM64	Camion 6X4	Heure	Engin	Non géré		
CAM84	Camion 8X4	Heure	Engin	Non géré		

Les ressources doivent appartenir à un type planifiable et avoir une unité heure

Fiche achat Prix Fournisseurs Infos/Documents Lien ouvrages Suivi des commandes Modulation

Code BANCHE

Libellé BANCHE

Unité **Heure** Delai Livr 1 sem.

Les ressources peuvent aussi être utilisées dans les devis.

Ajout des quantités et des montants

La liste des ressources est accessible en mode Superviseur par :

- Le menu « **Options- Ressources** »
- Le menu « **Options > Paramètres > Métier > Type de salarié** » et le bouton Ressources.

Liste Métier

- Regroupement type
- Type de salarié
- Champ optionnel
- Repas
- Déplacement
- Absence
- Certificat/Habilitation
- Motif d'heure
- Famille d'article

Type de salarié Taux

Code	Type de salarié	Regroupement	Ordre	Couleur	Int.	Budget	Dés.
Chant	MO Chantier	MAIN D'OEUVRE	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atel	MO Atelier	MAIN D'OEUVRE	2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etud	MO Etude	MAIN D'OEUVRE	3		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chauf	MO Chauffeur	MAIN D'OEUVRE	4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chef	MO Chef de chantier	MAIN D'OEUVRE	5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interim	Interim	MAIN D'OEUVRE	6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
apprenti	apprenti	MAIN D'OEUVRE	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'ouverture de la liste des ressources affiche un encart rappelant les règles de paramétrages pour la visibilité et l'usage des ressources

Gestion des ressources

Les ressources du planning sont constituées en général de la main d'œuvre de production et pour certains corps d'états des engins. Pour les activer dans cet écran, il faut :

- Identifier les types de salariés en les marquant « Budget » (Voir commande Paramètres - Métier - Type de salarié) ;
- Identifier les articles « Engins » en marquant leur type « Ressource planning » (Voir commande Paramètres - Métier - Type d'article). Et vérifier que l'unité définie sur la fiche article est bien l'heure.

Ok

L'ajout des quantités et des montants sur les ressources

Dans la liste des ressources, après la modification de la ligne de ressources, vous pouvez définir une quantité dans le champ « Nb maxi planifiable » pour chaque ressource.

Vous pouvez aussi ajouter aussi un surcout horaire par zone de déplacement.

Cette usage est souvent mis en place dans les devis. Cela permet de modifier les montants déboursés horaires de la MO en fonction de la zone de déplacement affecté au devis.

Gestion des ressources

Type de salarié | Type d'article | Articles | Impression | Rechercher

Bibliothèque | Type article

Famille	Bibliothèque	Type d'article	Code	Libellé	Unité	Prix unitaire d'achat	Nb maxi planifiable	Doc	Dés.
MAIN D'OEUVRE	Etablissements (Tous)	MO Atelier	Atel	MO Atelier (TX1)	Heure	25.0000	0		
MAIN D'OEUVRE	Etablissements (Tous)	MO Chantier	Chant	MO Chantier (TX1)	Heure	30.0000	15		
MAIN D'OEUVRE	Etablissements (Tous)	MO Chauffeur	Chauf	MO Chauffeur (TX1)	Heure	25.0000	3		
MAIN D'OEUVRE	Etablissements (Tous)	MO Chef de ch...	Chef	MO Chef de chantier (TX1)	Heure	35.0000	3		
MAIN D'OEUVRE	Etablissements (Tous)	MO Etude	Etud	MO Etude (TX1)	Heure	32.0000	0		
MATERIEL et LOCATION	générale	Engin	BANCHE	BANCHE	Heure	0.0000	0		
MATERIEL et LOCATION	générale	Engin	BETONNIERE	BETONNIERE	Heure	10.0000	0		
MATERIEL et LOCATION	générale	Engin	BULL	BULL	Heure	50.0000	0		
MATERIEL et LOCATION	générale	Engin	CAM10T	Camion 10T	Heure	20.0000	0		
MATERIEL et LOCATION	générale	Engin	CAM64	Camion 64t	Heure	25.0000	0		

Les ressources doivent appartenir à un type planifiable et avoir une unité heure 35 article(s)

Res. budget/planning

Code: | Libellé: | Unité: | Type d'article:


Débouré horaire de base: | **Nb maxi planifiable:** | Bibliothèque:

Coût par zones de déplacement :		Taux de la société : Caen/ Secteur : BTP	
Zone	Débouré de base	Surcoût horaire	Débouré budget
Z0	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Z1	30,00 €	1,00 €	31,00 €
Z2	30,00 €	2,00 €	32,00 €
Z3	30,00 €	3,00 €	33,00 €
Z4	30,00 €	4,00 €	34,00 €
Z5	30,00 €	5,00 €	35,00 €
Z6	30,00 €	6,00 €	36,00 €
ZGD	30,00 €	80,00 €	110,00 €

Planifier une ressource dans Optim'BTP


Activer « Autres ressources » en cliquant sur le bouton dans la barre de menu

L'onglet à droite « Ressources » active l'accès à l'onglet « Autres ressources ».

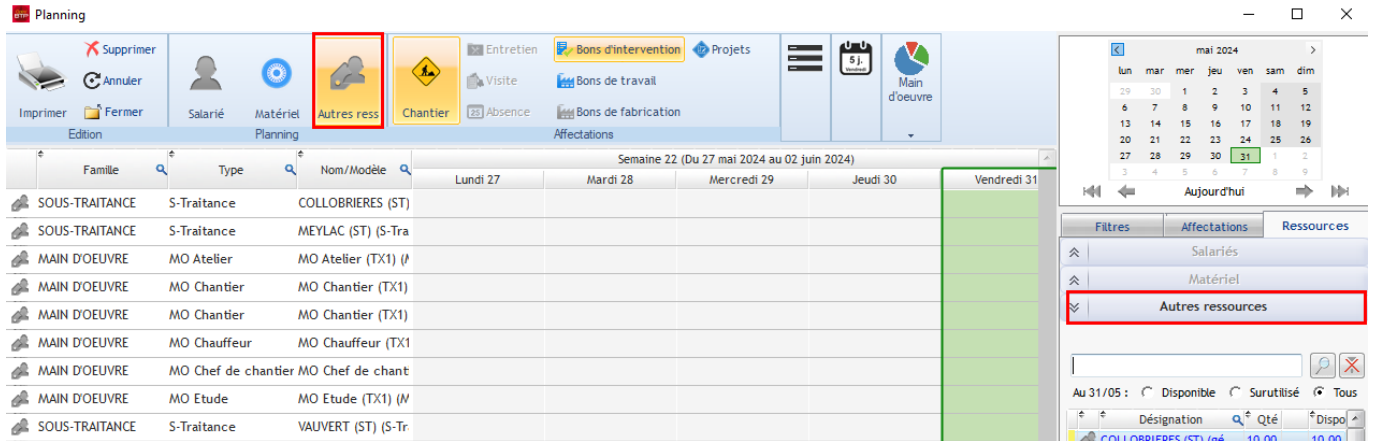

Affectation à un chantier

- Avec un clic droit sur la ressource :



- En faisant glisser la ressource sur le chantier

Saisie des quantités associées au chantier

Quantité nécessaire à planifier.



Il s'agit de la quantité maximum disponible de cette ressource.

Planning

Supprimer Annuler Imprimer Fermer Salarié Matériel Autres ress Chantier Edition Affections

Entrelien Bons d'intervention Projets Couleur : Chantier ressources Affections virtuelles Affichage Affichage précédent Voir tout Actualiser Effacer les filtres

Visite Bons de travail Absence Bons de fabrication Rsp chantier Qtes : Disponibles Affectées

Mois : février 2024

		Sem 9 (26/02 - 03/03)					Sem 10 (04/03 - 10/03)					Sem 11 (11/03 - 17/03)					Sem 12 (18/03 - 24/03)				
		L 26	M 27	M 28	J 29	V 1	L 4	M 5	M 6	J 7	V 8	L 11	M 12	M 13	J 14	V 15	L 18	M 19	M 20	J 21	V 22
SOUS-TRAITANCE	S-Traitance	COLLOBRIERES (ST)																			
SOUS-TRAITANCE	S-Traitance	MEYLAC (ST) (S-Trai)																			
MAIN D'OEUVRE	MO Atelier	MO Atelier (TX1) (M)																			
MAIN D'OEUVRE	MO Chantier	MO Chantier (TX1) (M)																			
MAIN D'OEUVRE	MO Chauffeur	MO Chauffeur (TX1) (M)																			
MAIN D'OEUVRE	MO Chef de chantier	MO Chef de chantier (TX1) (MC)																			
MAIN D'OEUVRE	MO Etude	MO Etude (TX1) (MC)																			
SOUS-TRAITANCE	S-Traitance	VAUVERT (ST) (S-Trai)																			
Ressource : MEYMAC - MEYLAC (ST) (6)		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Type : S-Traitance		23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0

8 enregistrement(s)

Chantiers

Planifié au 26/02 Jamais planifié Tous

- 103502 Chantier de AUDEUX
- 103602 Chantier de THIZY
- 103834 Chantier de PRADES
- 104082 Chantier de CAMBRIN
- 105047 Chantier de SARTILLY

MEYLAC (ST)

Du Lundi 26/02 au Vendredi 29/03

Q16 3.00 (ressource 6.00)

15P0007.01 RSD LES JARDINS CHARTRES

28000 - CHARTRES

Client : Client de CAZAUBON CAFF : DG CTvx : PN

MEYMAC - MEYLAC (ST)

S-Traitance

Planning

Supprimer Annuler Salarié Matériel Autres ress Chantier Entretien Bons d'intervention Projets Affectations virtuelles Affichages Affichage précédent Voir tout Actualiser Effacer les filtres Synthèse Génération MO & mat. Main d'oeuvre

Edition Fermer Salarié Matériel Autres ress Chantier Affections virtuelles Affichages Affichage précédent Voir tout Actualiser Effacer les filtres Synthèse Génération MO & mat. Main d'oeuvre

Semaine 16 (Du 18 avril 2022 au 24 avril 2022)

103602 - Chantier de THIZY (THIZY)
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier ELGAR Edw 103602 | Chantier de THIZY | ELGAR Edward

104629 - Chantier de ARLEUX (ARLEUX)
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BERLIOZ Hec 104629 | Chantier de ARLEUX | BERLIOZ Hector
 MAIN D'OEUVRE apprenti BOUCHER Yoh 104629 | Chantier de ARLEUX | BOUCHET Yann
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BRAHMS Joh 104629 | Chantier de ARLEUX | BRAHMS Johannes
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier CHAUVET Kev 104629 | Chantier de ARLEUX | CHAUVET Kevin
 SOUS-TRAITANCE S-Traitance MEYLAC (ST) (S-Tra 104629 | Chantier de ARLEUX | MEYLAC (ST) (S-Tra)

14P0060.01 - 150 LOGTS MANTES | Couverture (MANTES)
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BERLIOZ Hec 14P0060.01 | 150 LOGTS MANTES | Couverture | BERLIOZ Hector
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier RAVEL Mau 14P0060.01 | 150 LOGTS MANTES | Couverture | RAVEL Maurice

14R0434.01 - 98 LOGTS FLERS - Couverture (FLERS) - CA
 BARTOK (Tracto) 14R0434.01 | 98 LOGTS FLERS - Couverture | BARTOK (Tracto) ...
 CHOPIN (Camion) 14R0434.01 | 98 LOGTS FLERS - Couverture | CHOPIN (Camion) ...
 DEBUSSY Cla 14R0434.01 | 98 LOGTS FLERS - Couverture | DEBUSSY Claude
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier STRAVINSKY Igo 14R0434.01 | 98 LOGTS FLERS - Couverture | STRAVINSKY Igor
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier WAGNER Ric 14R0434.01 | 98 LOGTS FLERS - Couverture | WAGNER Richard
 SOUS-TRAITANCE S-Traitance MEYLAC (ST) (S-Tra 14R0434.01 | 98 ...

15G0070.01 - 14 LOG JUVISY - Couverture (JUVISY) - CA
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BERLIOZ Hec 15G0070.01 | 14 LOG JUVISY - Couverture | BERLIOZ Hector
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier VIVALDI Antonio 15G0070.01 | 14 LOG JUVISY - Couverture | VIVALDI Antonio
 SOUS-TRAITANCE S-Traitance COLLOBRIERES (ST) 15G0070.01 | 14 LOG JUVISY - Couverture | COLLOBRIERES (ST)

15P0007.01 - RSD LES JARDINS
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier VERDI Giuseppe 15P0007.01 | RSD LES JARDINS CHARTRES | VERDI Giuseppe
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier VIVALDI Antonio 15P0007.01 | RSD LES JARDINS CHARTRES | VIVALDI Antonio

15P0008.01 - 5 BATIMENTS MAREIL | Couverture (MAREIL)
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BARTOK (Tracto) 15P0008.01 | 5 BATIMENTS MAREIL | Couverture | BARTOK (Tracto) Béla
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier BEETHOVEN Lud 15P0008.01 | 5 BATIMENTS MAREIL | Couverture | BEETHOVEN Ludwig
 MAIN D'OEUVRE MO Chantier PROKOFIEV Ser 15P0008.01 | 5 BATIMENTS MAREIL | Couverture | PROKOFIEV Serguei

Ressource : MEYMAC - MEYLAC (ST) (6) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Type : S-Traitance 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Choix entre vision des quantités « Disponibles » ou « Affectées » en bas de page

Informations sur la ressource

Indicateur du nombre de quantités affectées (ou de disponibilité) de la ressource (Meymac)

Indicateur du nombre d'affectation (ou de disponibilité) du type de la ressource (ici sous-traitance)

avril 2022
 lun mar mer jeu ven sam dim
 28 29 30 31 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 1
 2 3 4 5 6 7 8

Aujourd'hui

Filtres Affectations Ressource

Salariés
 Matériel
 Autres ressources

Au 22/04 : Disponible Surutilisé

Désignation Qté Dispo

COLLOBRIERES (ST) (gé... 10,00 ... 2,00
 MEYLAC (ST) (génér) 6,00 ... 0,00
 MO Atelier (TX1) (Etab) 0,00 ... 0,00
 MO Chantier (TX1) (Etab) 15,00 ... 15,00
 MO Chauffeur (TX1) (E... 3,00 ... 3,00
 MO Chef de chantier (T... 3,00 ... 3,00
 MO Etude (TX1) (Etab) 0,00 ... 0,00
 VAUVERT (ST) (génér) 10,00 ... 10,00

Glissez la ressource sur le planning

Ressource(s) hors planification (0)

MEYLAC (ST)
 Du Vendredi 22/04 au Vendredi 22/04
 Qté 6,00 (ressource 6,00)

104629 Chantier de ARLEUX
 59151 - ARLEUX
 Client :
 MEYMAC - MEYLAC (ST)
 S-Traitance
